



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ"

Аналитичен преглед на изпълнението на ОП «Регионално развитие» 2007-2013г. и предизвикателства при изпълнение на правилото $N+2/N+3$

28.05.2013г., гр. Трявна

**www.mrrb.government.bg
www.bgregion.eu**




Общ преглед на изпълнението на ОПРР към 20.05.2013г.


- Публикувани **48** схеми за предоставяне на БФП на обща стойност **3,131** млрд. лв. или **100 %** от бюджета на ОПРР (**3,131** млрд. лв.)
- Брой подадени проектни предложения – 1 893
- Общ брой сключени договори – **1 038** с общ размер на предоставената БФП – **3,007** млрд. лв. или над **96%** от бюджета на ОПРР
- Общ размер на плащанията по договори – **1,316** млрд. лв. или **44%** от размера на договорените средства и **42%** от бюджета на ОПРР
- Към края на 2013 г. очакван брой сключени договори – **1 116** с общ размер на БФП **3,131** млрд. лв. или **100 %** от бюджета на ОПРР
- Към края на 2013 г. очакван размер на плащанията – **1,947** млрд. лв. или **64%** от размера на договорените средства и **62%** от бюджета на ОПРР



Финансово изпълнение на ОПРР към 20.05.2013г.

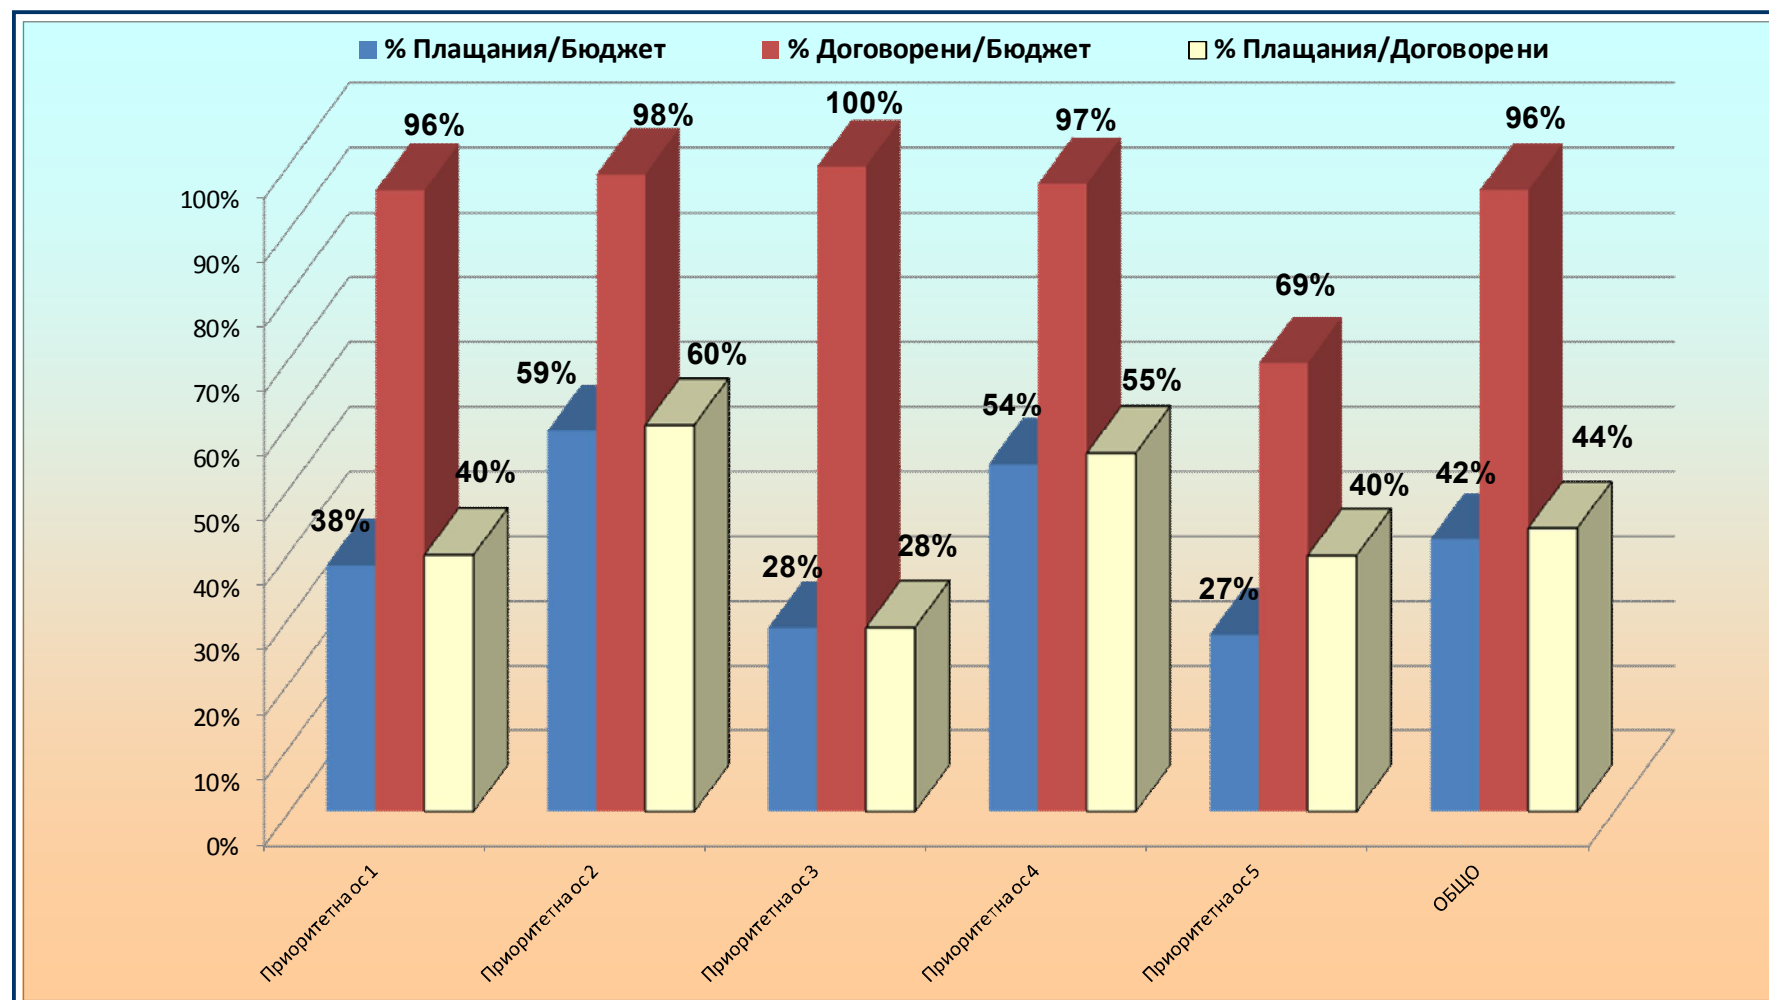


Изпълнение на приоритетна ос 1 в рамките на агломерационните ареали (млн.евро) към 20.05.2013г.

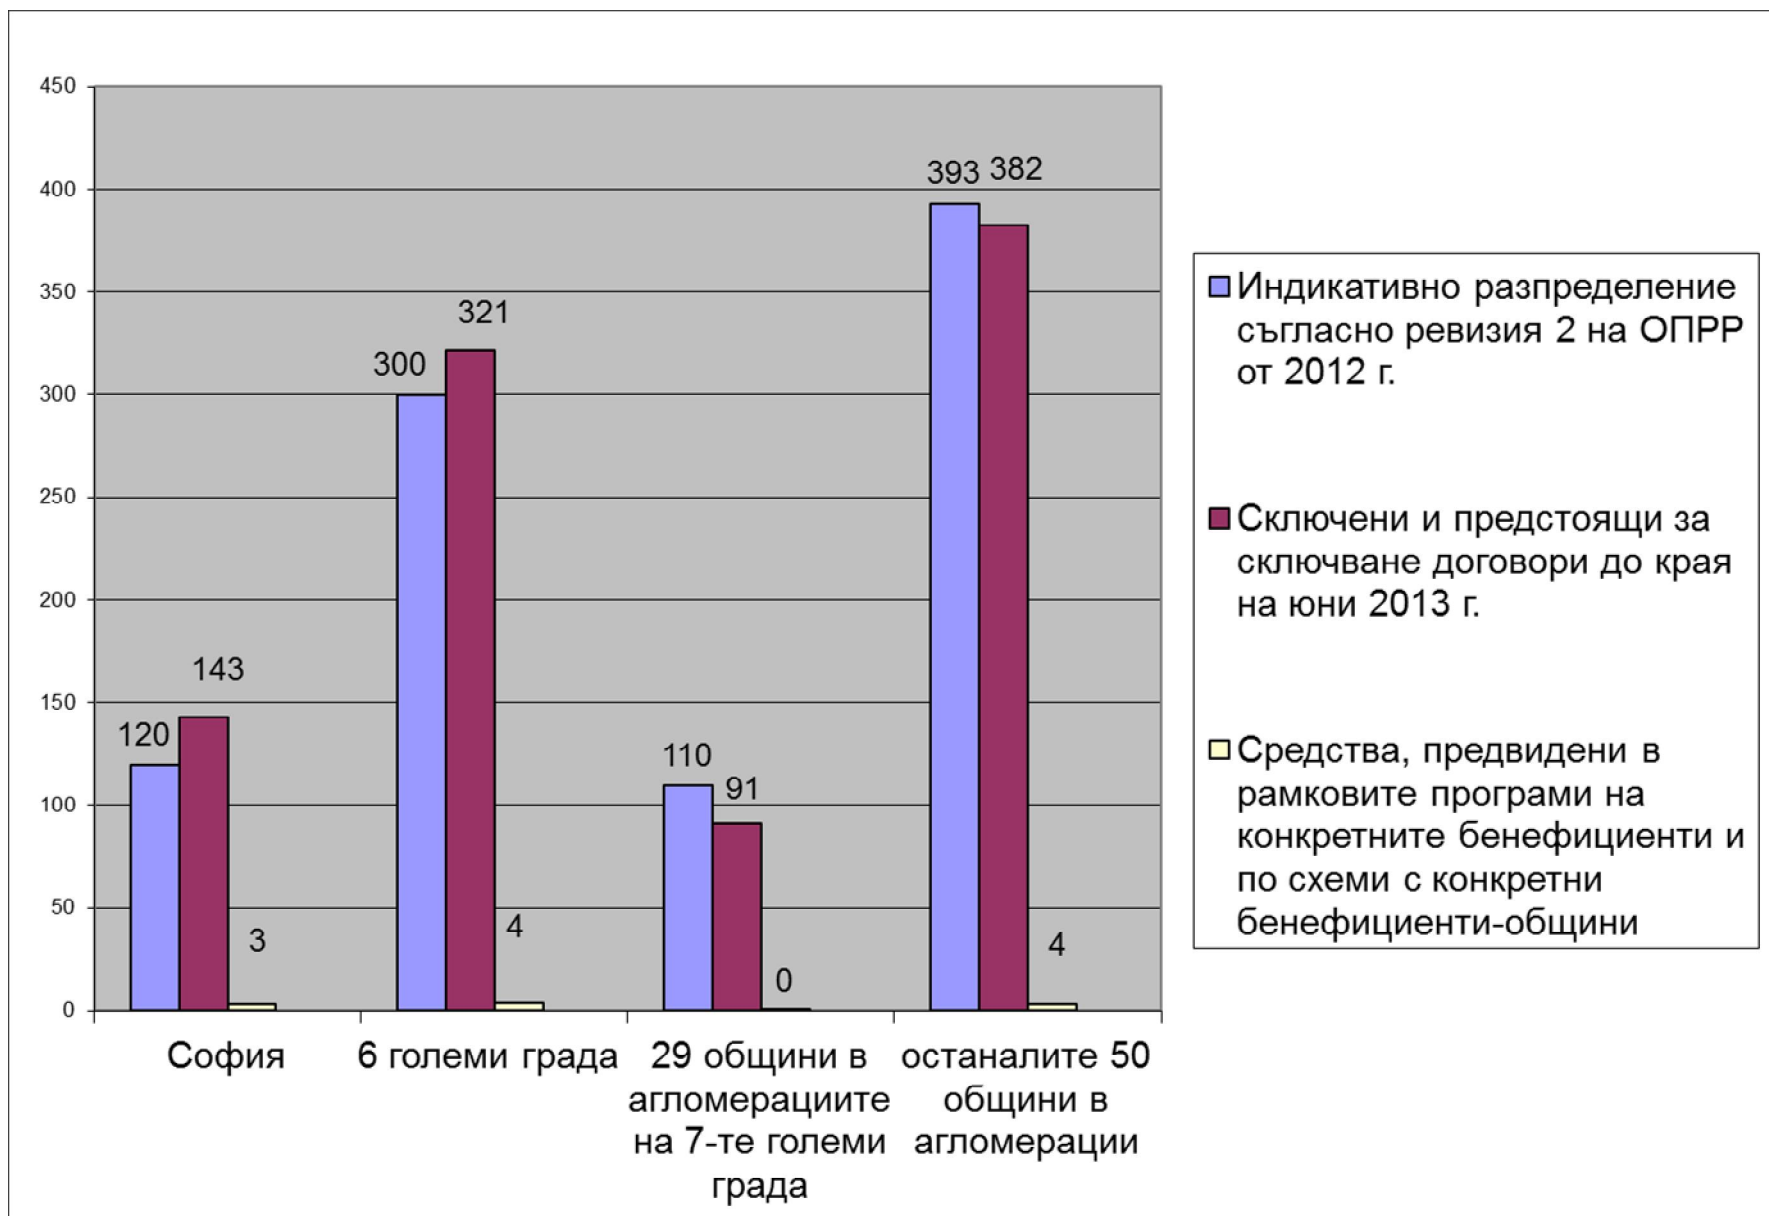



Успешни примери на ключови инвестиции

- Интегриран градски транспорт
- Инициатива JESSICA
- Рехабилитация/реконструкция на второкласна и третокласна пътна мрежа
- Деинституционализация на децата в България
- Енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради



Предизвикателства при изпълнение на правилото N+2/N+3 (1)

Изпълнение на прогнози в системата Лотар на ЕК


Прогноза за верифицирани разходи към 31.12.2013 – 1,613 млрд. лв. -ЕФРР

Верифицирани разходи към 20.05.2013– 863 млн. лв. - ЕФРР или 53 % от прогнозата

Прогноза за сертифицирани разходи към 31.12.2013 – 1,335 млрд. лв. - ЕФРР

Сертифицирани разходи към 20.05.2013 – 805 млн. лв. - ЕФРР или 60 % от прогнозата

Остатък за сертификация до края на 2013г. – 528 млн.лв. - ЕФРР




Предизвикателства при изпълнение на правилото N+2/N+3 (2)

Потенциален риск от загуба на средства:

- **Оптимистичен – 143 млн. лв. ЕФРР**
- **Песимистичен – 241 млн. лв. ЕФРР**
- **Подадени искания за плащане в обработка – 114 млн.лв.**

Причини за установения риск:

- *забава на изпълнението в резултат от стартирали съдебни производства и административни обжалвания на процедурите за избор на изпълнители;*
- *сигнали за нередности, водещи до налагане на финансови корекции*
- *забава на реализацията на проектните дейности вследствие на късно стартиране на тръжните процедури или текущо прекратяване на същите;*
- *незадоволителното качество на физическото изпълнение на инфраструктурните проекти, водещо до забава на верификацията;*
- *недостатъчната активност от страна на бенефициентите в процеса по подаване на регулярни искания за плащане към УО.*



Предприети стъпки за намаляване на риска


Към м.януари 2013 г. – установени рискови проекти – **237 бр.** на стойност **741 млн.лв. (41%)** от всички проекти в изпълнение – 1,808 млрд.лв.

- ✓ Проведени съвместни срещи с всеки бенефициент с рискови проекти и изготвен индивидуален план за действие за минимизиране на риска
- ✓ Регулярен мониторинг по изпълнението на проекти по ОПРР

Постигнат резултат: към м.май 2013г. – извършена актуализация на анализ на изпълнението на проектно ниво:

515 договори в изпълнение на стойност **1,727 млрд.лв.**

Рискови проекти (без сключени договори с основни изпълнители до 10 месеца от датата на сключване на ДБФП) – **84 бр. на обща стойност 158 млн.лв. (9%)** – над **4 пъти** намаление на рисковите проекти




Актуализация на анализ на проектно ниво

Високо рискови проекти – без сключени договори с основни изпълнители над 10 месеца от сключване на договора за БФП – **84 бр. на обща стойност 158 млн.лв.**

Рискови проекти – проекти без сключен договор с основен изпълнител – **11 бр. на стойност 53 млн.лв.**

Проекти със сключени основни договори, но без подадени междинни плащания – **206 бр. на стойност – 889 млн.лв.**

Проекти с добро изпълнение и регулярно подавани искания за плащане – 214 бр. на стойност – **627 млн.лв.**



Актуализация на анализ на проектно ниво

Проекти на бенефициенти – общини

Високо рискови – 61 договора на стойност 128 млн.лв.

(общинска образователна, инфраструктура, иновативни културни събития, общински болници, превенция от наводнения, туристически атракции)

Рискови (без основен договор с изпълнител) – 11 бр. на стойност 53 млн.лв.

(общински болници, социални жилища)


Рискови (без подадени плащания) – 177 договора на стойност 684 млн.лв.

Проекти на конкретни бенефициенти

Високо рискови – 23 договора на стойност 30 млн.лв.

(държавна образователна, културна, социална инфраструктура, национален туристически маркетинг)

Рискови (без подадени плащания) – 29 договора на стойност 205 млн.лв.



Стъпки за преодоляване на риска от прилагане на правилото N+2/N+3

Изготвени и анализирани варианти за действие, като най-приложим за минимизиране на риска – следните варианти:


След провеждане на допълнителни срещи с бенефициенти - прекратяване на договори за БФП по високо рискови проекти, като на тяхно място се включват за финансиране:

- голям проект по смисъла на чл.39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006г.
- изпълнени проекти с национално финансиране, които отговарят на приоритетите, целите и бенефициентите на ОПРР (области – градска среда, образователна инфраструктура, социална инфраструктура и др.)



Ефект от изпълнението на ОПРР към 20.05.2013г. (1)

- Брой приключени проекти – **361**
- Ремонтирани/реконструирани сгради на образователна, социална и културна инфраструктура – **596 сгради**
- Население, повлияно от обновените сгради на образователна, социална и културна инфраструктура – **над 1,8 млн. души**
- Рехабилитирани/ реконструирани пътища – **514 км**
- Площ на свлачища, които са укрепени и/или на които е изградена контролно измервателна система – **над 1,16 млн. кв.м.**

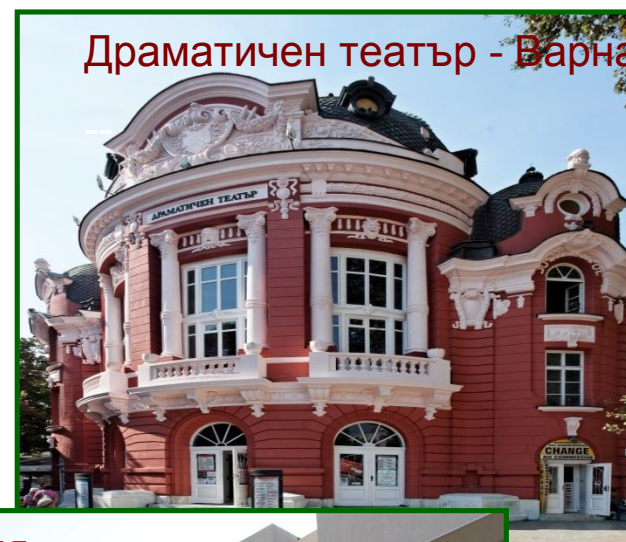

Драматичен театър - Варна



ТУ- София



Ефект от изпълнението на ОПРР към 20.05.2013г. (2)


- Население, облагодетелствано от укрепване на свлачища – **над 622 хил. души**
- Подобрена паркова среда, озеленени площи, детски площадки – **над 2,7 млн. кв.м.**
- Население, облагодетелствано от обновена градска среда – **над 2,9 млн. души**
- Изградени/рехабилитирани пешеходни зони, велоалеи, тротоари – **над 715 хил. кв.м.**
- Осигурени паркоместа в близост до възловите транспортни точки на периферните градски зони – **2842 бр.**



Червената църква - Перущица



Хасково – Градска среда



Подобряване ефективността на работа на УО

Осъществен избор на нова сграда (бул. „Тодор Александров” №109) с нетна ползваема площ от 2000 кв. м.

Цел: гарантиране на нормалното и успешно осъществяване на всички работни процеси, обвързани с изпълнението на ОПРР, по-ефективна работа на УО и подготовка за следващия програмен период.


22.01.2013 г. - сключен договор за наем на 22.01.2013 г. и осъществено поетапно пренасяне на оборудването и състава на дирекцията при непрекъснат работен режим по изпълнението на ОПРР.

12.02.2013 г. – проведено официално откриване на новия офис на ГД „ПРР“ в присъствието на представители на Европейската комисия и съгласно изискванията за информация и публичност.




Действия по информация и публичност

- 3 официални церемонии по подписвания на договори;
- 12 публикации в печатни медии по проект “Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на ОПРР и популяризирането ѝ чрез електронните и печатни медии”;

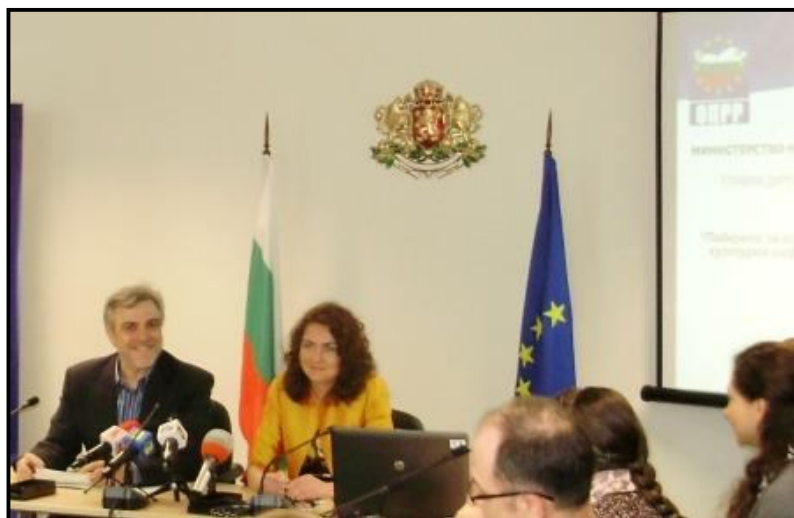

- Официално откриване на нов офис на ГД “Програмиране на регионалното развитие”
- Провеждане на 2 заседания на тематичната работна група за ОП “Региони в растеж” 2014-2020;
- Обучение за електронно кандидатстване по схема “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II”.



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Деница Николова

Ръководител на Управляващия орган на ОПРР

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

www.mrrb.government.bg

www.bgregio.eu
